



Checkliste für Fassadenverglasung


Checkliste für Montagebetriebe – Ausführung von Fassaden mit Punkthaltern

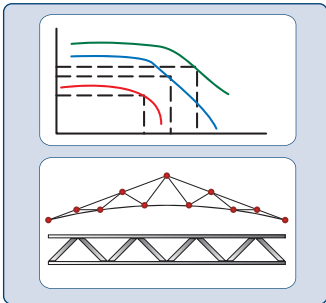

Überprüfung der Unterlagen

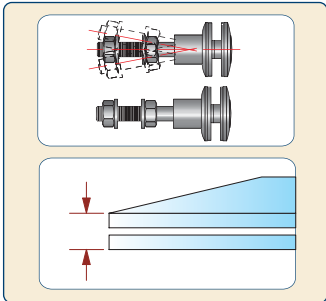

Überprüfung Bestandteile

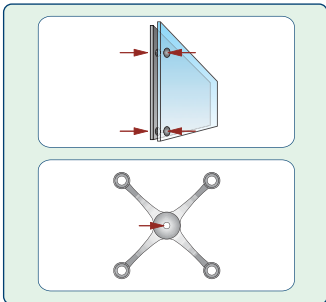

Montage

Sind alle Punkte eingehalten?



Liegt statische Berechnung für Glas gemäß AbZ oder Auszug aus Typenstatik vor?

INGENIEUR-BÜRO



Unterkonstruktion: Ist die Unterkonstruktion ausreichend tragfähig? (Statik, Prüfbericht!)



Liegt Ü-Zeichen für Glas vor?



Liegt Ü-Zeichen für Punkthalter und die AbZ vor?



Liegen geeignete, nachgewiesene Bauteile für den Anschluß an der Unterkonstruktion vor (z.B. geeignete, nachgewiesene Spider)?



Stimmen die vorliegenden Punkthalter von Pauli + Sohn mit der Planung überein?



Auswahl der Schrauben in Übereinstimmung mit der Glasstärke (siehe Tabelle)



Montageanleitung beachten: Frontmontage oder rückseitige Montage



Spider: Verdrehsicherung über Bohrung oder anderweitig?



Zwängungsfreie Montage sicherstellen (Langlöcher / konstruktive Maßnahmen)



Ggf. Versiegeln der Fugen



ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG unterzeichnen und an den Bauherrn übergeben!
